


チャレンジの概要 - 2010年度迄の開通計画 -



高速：整備計画延長ベース

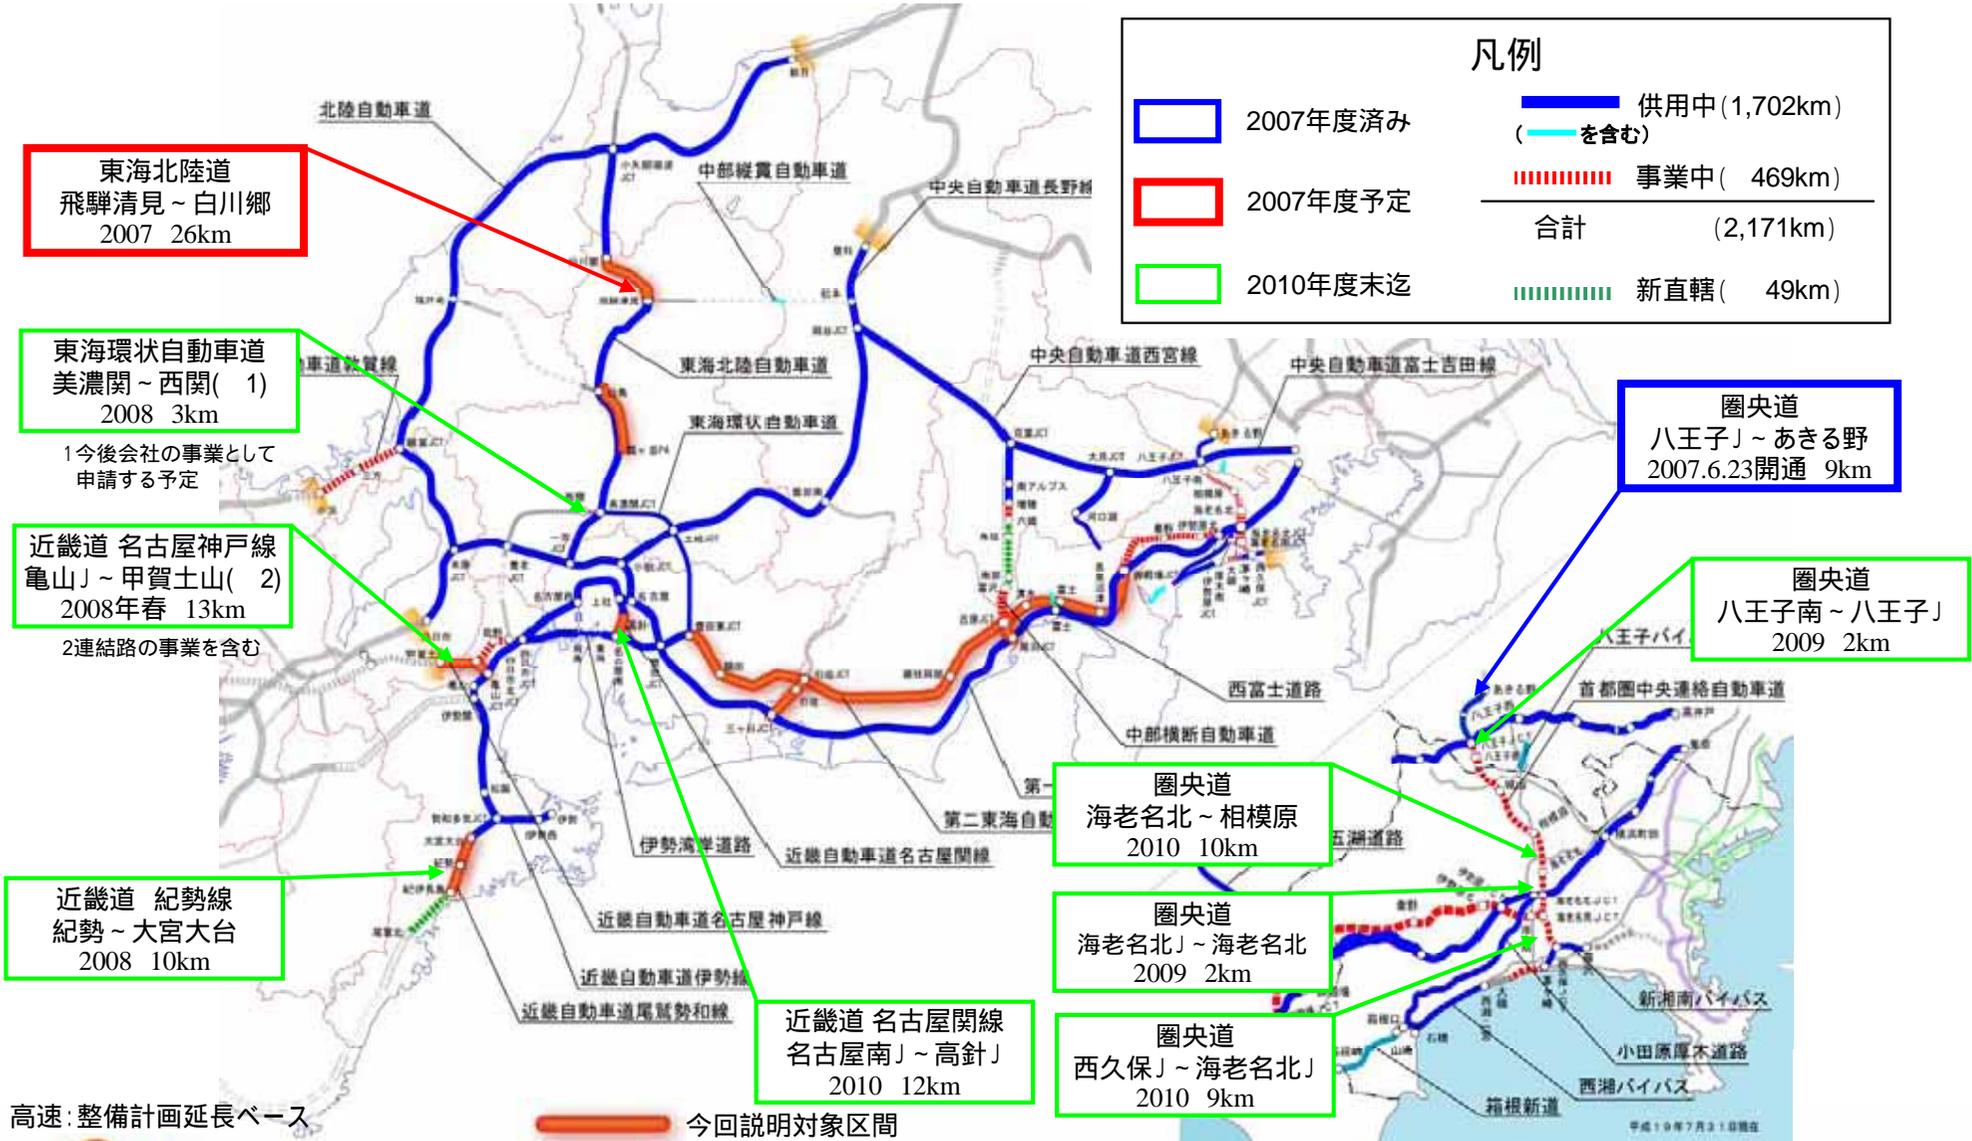

平成19年7月31日現在

第二東名高速道路 御殿場JCT～引佐JCT 現地状況 (平成24年度完成予定区間)



森町PA付近




清水IC付近



富士IC付近



天竜川橋付近

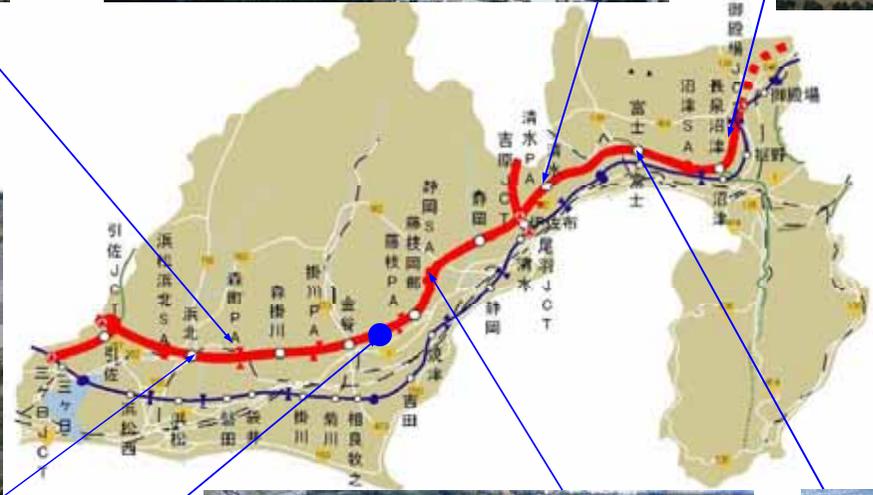

島田第一トンネル西坑口付近
平成19年8月29日貫通予定

御殿場JCT～引佐JCT
工事全面展開中
用地99%一部残件有

島田第一トンネル



静岡SA付近




富士IC付近

第二東名(引佐JCT~豊田東JCT) 現地状況 (平成26年度完成予定区間)



米河内地区付近

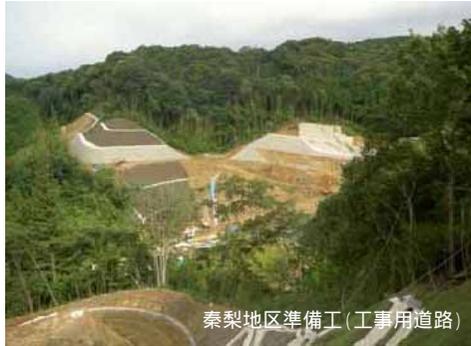


秦梨地区準備工(工事用道路)



稲木地区準備工(現道拡幅)

引佐JCT~豊田東JCT
用地8割取得
準備工事に着手

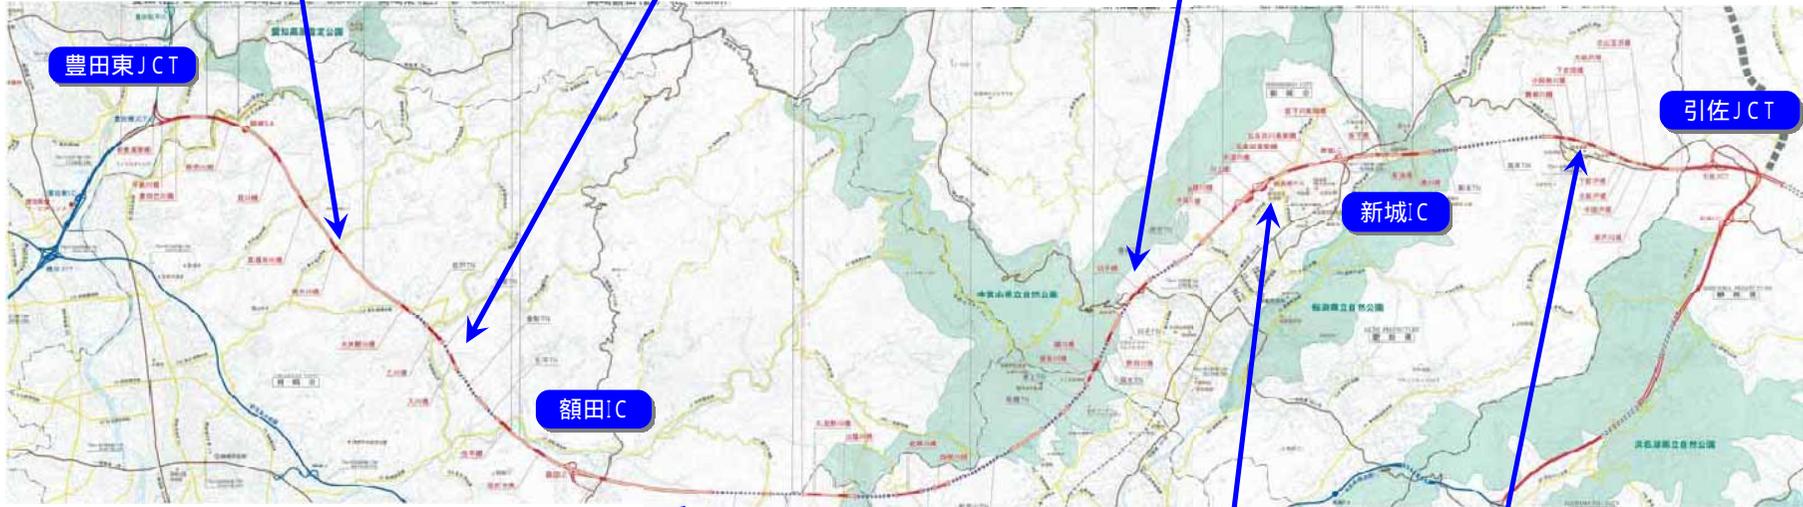

鹿勝川地区準備工(本線BOX)



矢部地区準備工(現道拡幅)



浦梨沢地区準備工(仮栈橋)

新名神高速道路 亀山JCT～草津田上IC 現地状況 (平成20年春完成目標)



亀山JCT～草津田上IC
工事全面展開中 (土工ほぼ完了)
現在、舗装・施設工事中

NEXCO西日本

土工施工状況 (大津JCT)



舗装工事状況 (近江大鳥橋)



舗装工事状況 (甲南トンネル(下り線))



休憩施設工事状況 (土山SA)



舗装工事状況 (錐ヶ瀬橋)



NEXCO中日本

舗装工事状況 (鈴鹿トンネル)





舗装工事状況 (亀山JCT付近)



出典 : 西日本高速道路株式会社

東海北陸自動車道 飛騨清見IC～白川郷IC 現地状況 (平成19年度完成予定区間)

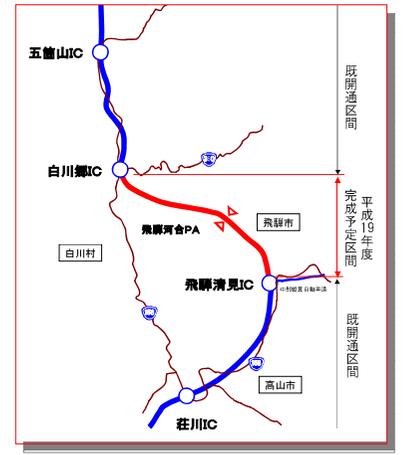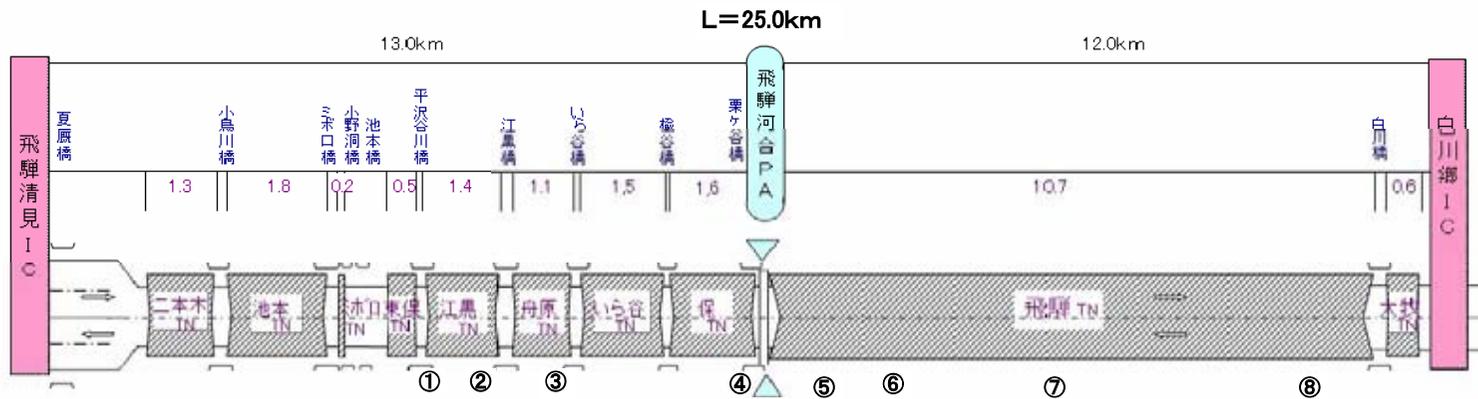

【飛騨清見IC～飛騨河合PAの区間】
舗装・施設工事中

【飛騨トンネル区間】
トンネル本体工事の仕上げ中。今後、舗装・施設工事着手

東保トンネル付近の明かり部
舗装工事中



舟原トンネル
舗装工事中



江黒トンネル
舗装工事中



保トンネル(北坑口)
舗装工事中



飛騨トンネル 河合側
路床施工完了



飛騨トンネル
非常駐車帯(一部)の拡幅工事中




飛騨トンネル 貫通点付近
路床施工中



飛騨トンネル 白川郷側
覆工コンクリートの施工準備中



東海北陸自動車道 瓢ヶ岳PA～白鳥IC 四車線化事業 現地状況（平成20、21年度完成予定区間）

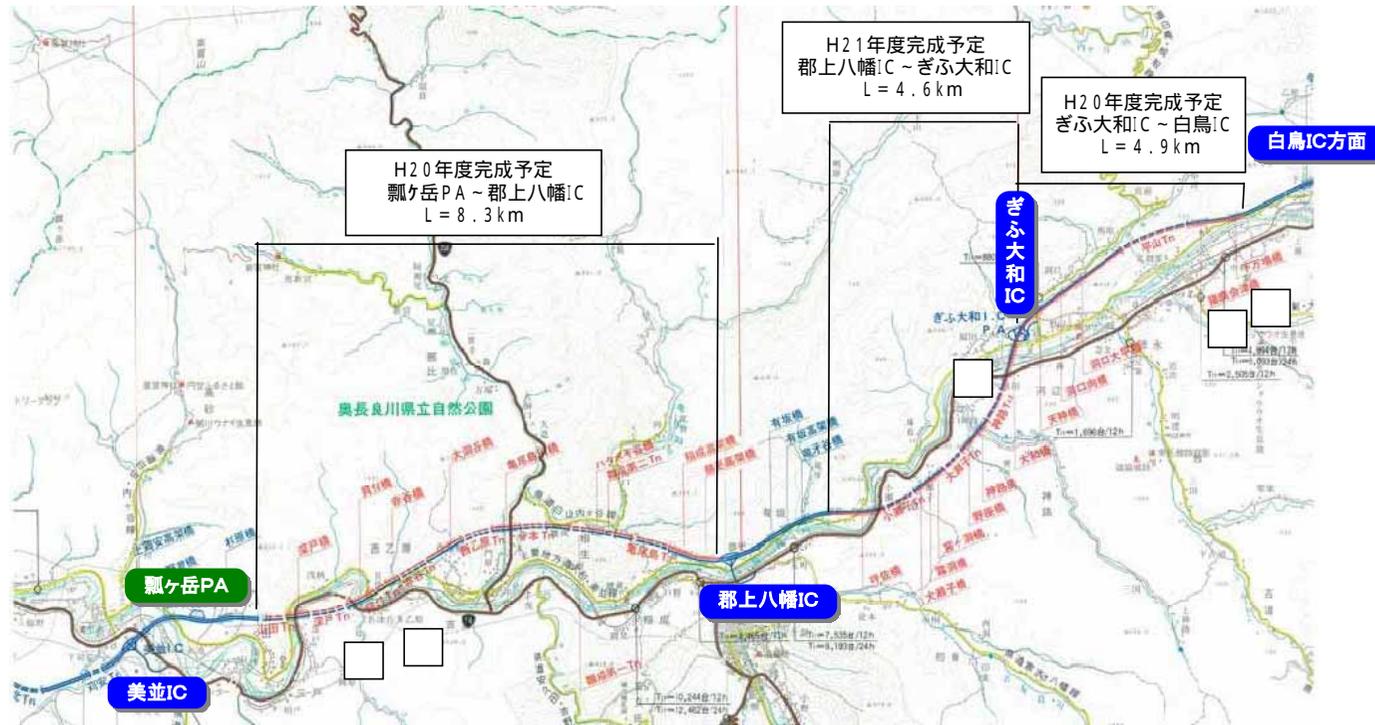

工事全面展開中



① 深戸橋
(瓢ヶ岳～郡上八幡間)



② 貝付橋
(瓢ヶ岳～郡上八幡間)



③ 大和橋
(郡上八幡～ぎふ大和間)



④ 平山トンネル北坑口付近
(ぎふ大和～白鳥間)





⑤ 平山トンネル北坑口付近
(ぎふ大和～白鳥間)



名古屋環状2号線 現地状況（平成22年度完成予定区間）

工事全面展開中

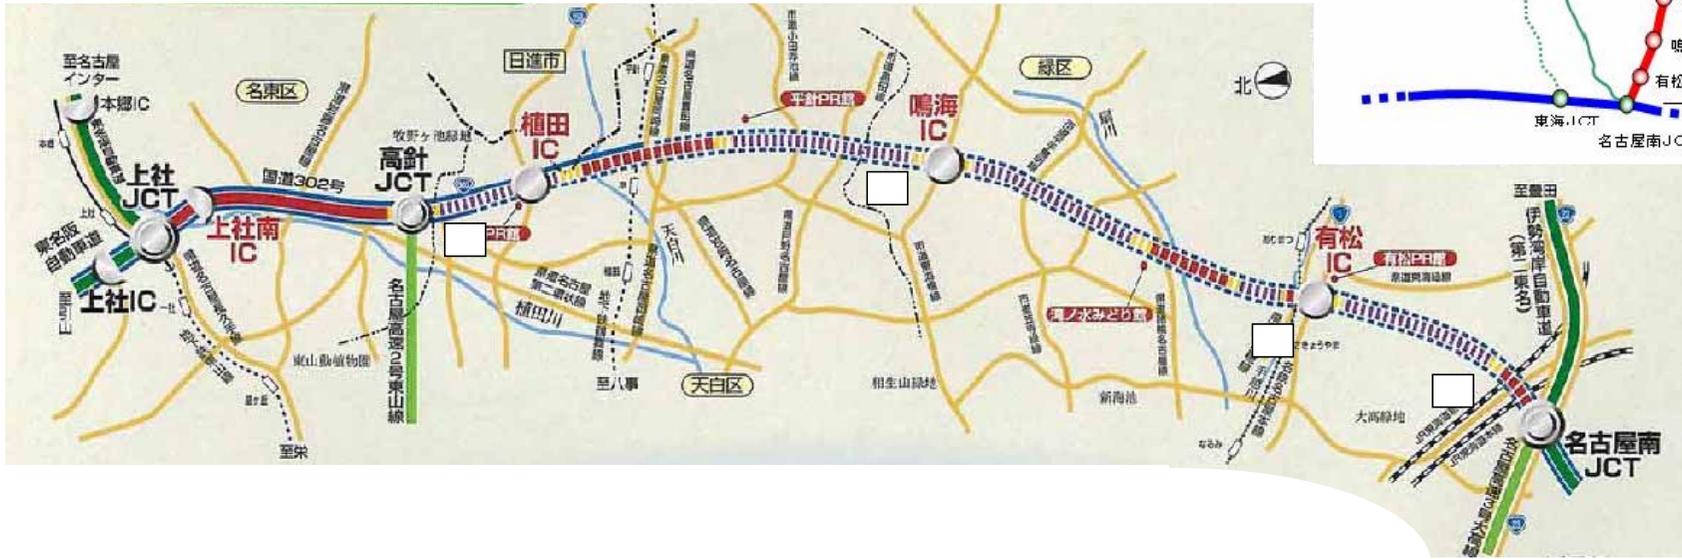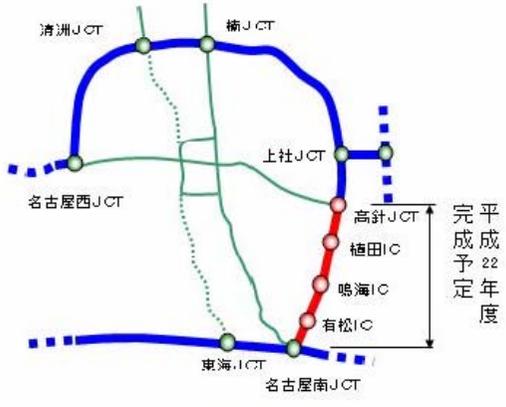

平成22年度
完成予定

高針JCT付近



鳴海IC付近



有松IC付近



名古屋南JCT付近




紀勢自動車道 紀伊長島IC～大宮大台IC 現地状況（平成20、24年度完成予定区間）



紀勢～大宮大台
工事全面展開中

紀伊長島～紀勢
用地6割取得
工事5割着手

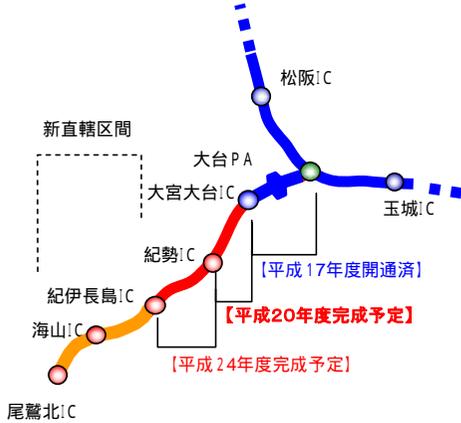

① 紀勢IC付近



② 紀勢大宮トンネル付近



③ 毘沙野第一トンネル付近



④ 菅合トンネル付近

平成19年9月8日
貫通予定

