


## 都夫良野トンネル(下り線の右ルート)の天井板撤去工事の概要


### 1. 工事の主な内容

- ・右ルートのトンネル入口部に設置されている天井板を、9月2日(月)～9月5日(木)の期間で撤去します。
- ・工事の期間中は、右ルートを閉鎖しますが左ルートは通常どおり通行できます。
- ・撤去する天井板などの数量は以下のとおりです。

下り線右ルート	天井板撤去:延長約13m (1カ所)、コンクリート覆工 剥落対策:約200㎡
---------	--

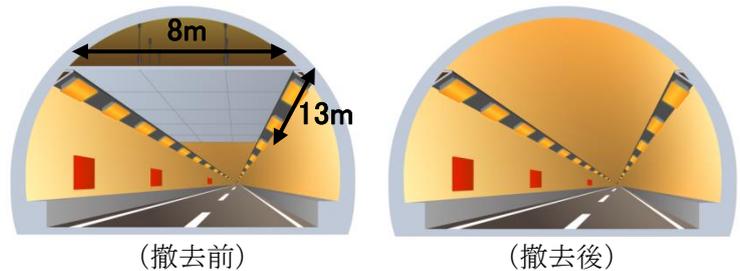

### 2. 工事の方法

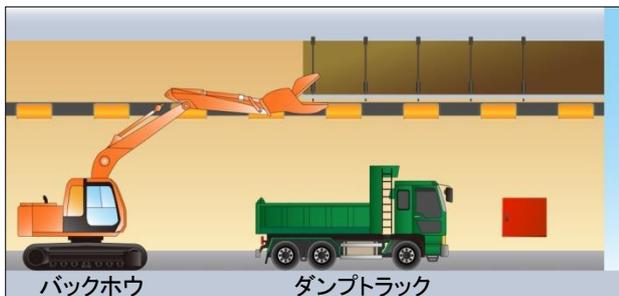

- ① バックホウで天井板を取り外し
  - ② 取り外した天井板をダンプトラックに積み込み
  - ③ ダンプトラックで搬出
- ① ⇒ ② ⇒ ③ の手順で施工します。
- 上記、施工終了後
- ④ コンクリート覆工の剥落対策

### 3. 現況写真



### 4. トンネル諸元

	下り線 右ルート	下り線 左ルート(参考)
IC区間	御殿場IC(静岡県御殿場市東田中) ～ 大井松田IC(神奈川県足柄上郡大井町)	
所在地(坑口)	神奈川県足柄上郡山北町 ～ 神奈川県足柄上郡山北町	
トンネル延長	1,656m	1,689m
供用時期	1969年 5月 26日	
