

## ■ 工事概要と渋滞予測

### (1) 交通規制内容および日程

昼夜連続車線規制（準備作業）

2019年5月8日（水）から2019年5月17日（金）5時まで9日間

昼夜連続・対面通行

2019年5月17日（金）5時から2019年7月30日（火）24時まで75日間



昼夜連続車線規制


2019年7月31日（水）から2019年8月9日（金）まで10日間


### (2) 渋滞予測

交通規制期間中を通して渋滞の予測はありません。

### (3) 工事内容

#### ● 工事箇所


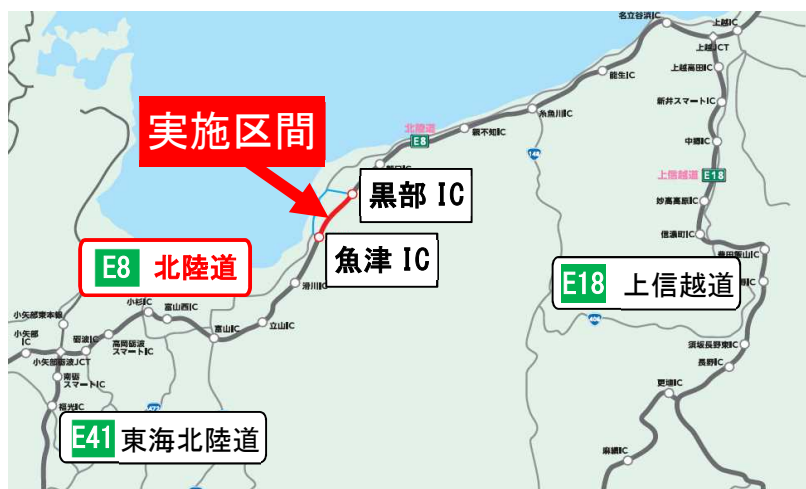


橋 梁 名	かたがいがわぼし 片貝川橋（下り線）	
開 通 日	1983年（昭和58年）12月23日（開通から35年経過）	
道 路 名・区 間	E8 北陸道 魚津 IC ～ 黒部 IC	
所 在 地	富山県魚津市六郎丸	
橋 長	245.2m	
橋 梁 上 部 工 形 式	RC 2径間連続中空床版+鋼（2+3）径間連続非合成桁+単純H鋼桁	
工 事 内 容	老朽化した橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取り替える工事 （鋼（2+3）径間連続非合成桁 延長約197mの部分を取り替えます）	

## ●主な実施予定の工事・作業

老朽化した橋梁のコンクリート床版を撤去し、新しい床版に取り替える工事をおこないます。

工事の際は、現場での作業時間短縮と品質向上のために、あらかじめ工場で製作されたプレキャストコンクリート床版に取り替えをおこないます。

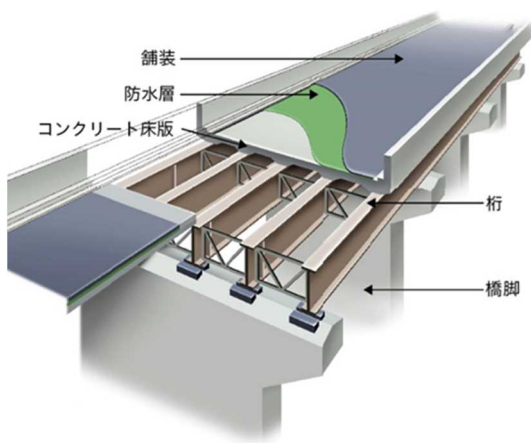

## 片貝川橋の損傷状況



## 床版取替工事のイメージ



老朽化した床版の撤去



新しい床版の設置

工事の手順と規制種別

