

■ 工事概要


1. 交通規制内容および日程

昼夜連続車線規制（準備作業）

2019年8月20日（火）から2019年8月30日（金）6時まで10日間

昼夜連続・対面通行規制

2019年8月30日（金）6時から2019年11月2日（土）24時まで65日間

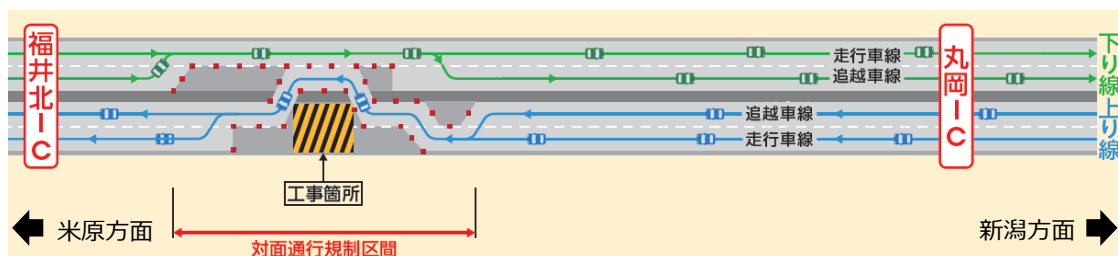

昼夜連続車線規制（後片付け）

2019年11月3日（日）0時から2019年11月12日（火）まで10日間

2. 工事内容

(1) 工事箇所




橋 梁 名	九頭竜川橋(上り線)	
開 通 日	1975 年（昭和 50 年）9 月 9 日（開通から 43 年経過）	
道 路 名 ・ 区 間	E8 北陸道 福井北 IC ～ 丸岡 IC	
所 在 地	福井県福井市北野上町	
橋 梁 長	454.9m	
橋 梁 上 部 工 形 式	鋼 3 径間連続非合成桁橋 + 鋼 2 径間連続非合成桁 + 鋼 3 径間連続非合成桁	
工 事 内 容	老朽化した橋梁のコンクリート床版を新しい床版に取り替える工事 (連続非合成桁 延長 286.7m の部分を取り替えます)	

(2) 主な実施予定の工事・作業

○ お客様の走行安全性と快適性を高めるために

老朽化した橋梁のコンクリート床版を撤去し、新しい床版に取り替える工事をおこないます。

工事の際は、現場での作業時間短縮と品質向上のために、あらかじめ工場で製作されたプレキャストコンクリート床版に取り替えをおこないます。

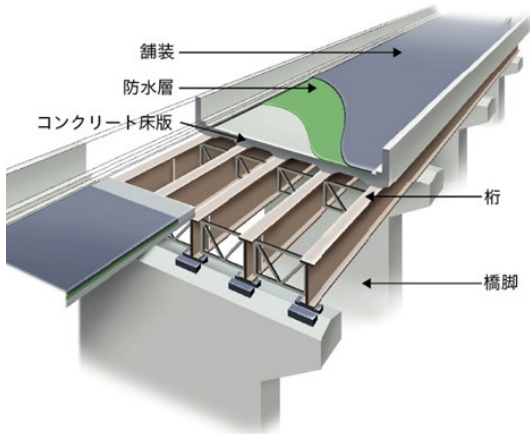

九頭竜川橋の損傷状況



九頭竜川橋の床版下面



九頭竜川橋の路面

床版取り替え工事のイメージ



老朽化した床版の撤去



新しい床版の設置

工事の手順と規制種別

