


東名阪道リニューアル工事(名古屋西IC～弥富IC:下り線)


2024年11月27日
中日本高速道路株式会社
定例記者会見 資料4-2

工事規制区間	工事規制実施期間
E23 東名阪道 名古屋西IC～弥富IC:下り線	【昼夜連続・車線規制】2025年1月27日(月)0時～2027年度春頃まで 《土日も工事規制を行います》
E23 東名阪道 蟹江IC～弥富IC:下り線	【夜間通行止】※期間中、夜間通行止めを複数回予定しています。詳細につきましてはあらためてお知らせいたします。
E23 東名阪道 蟹江IC:下り線入口	【夜間IC閉鎖】※期間中、夜間IC閉鎖を複数回予定しています。詳細につきましてはあらためてお知らせいたします。

工事規制区間と迂回ルート


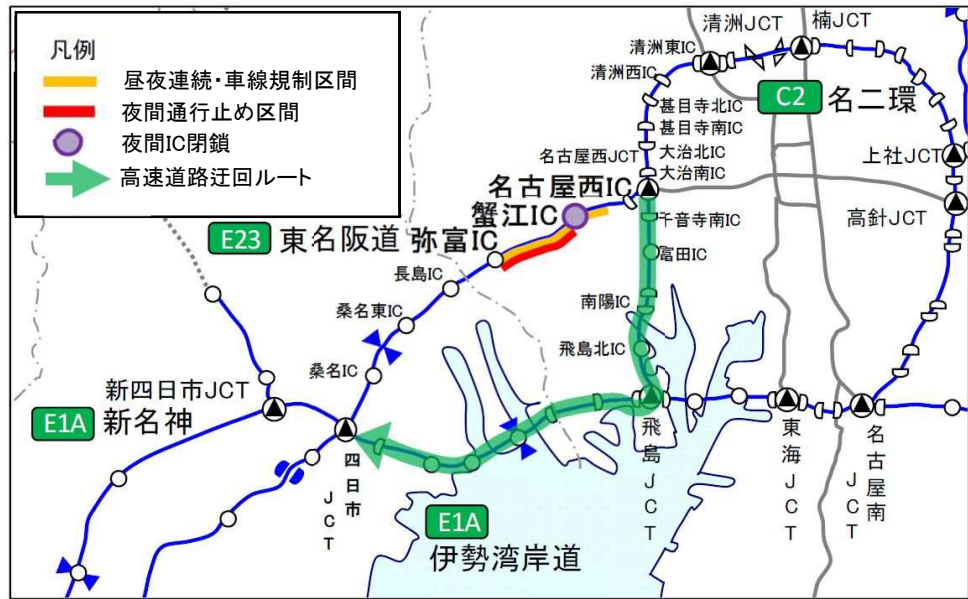


渋滞予測図

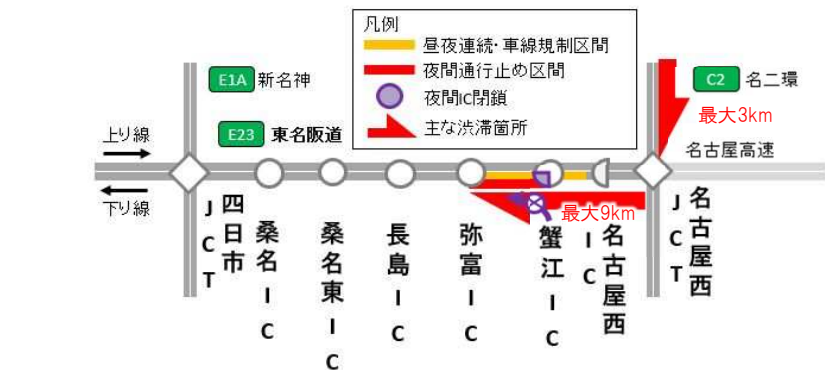

工事内容

お客様の走行安全性と快適性を高めるために老朽化した橋梁のコンクリート床版を撤去し、新しい床版に取り替える工事をおこないます。現場での作業時間短縮と品質向上のために、あらかじめ工場で製作したプレキャストコンクリート床版に取り替えます。

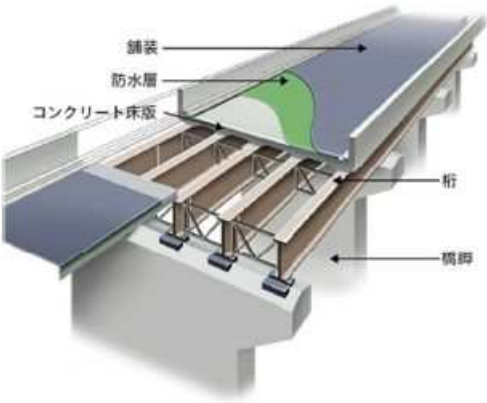

①走行車線 ②追越車線 ③中央分離帯

東名阪道リニューアル工事

ETC車限定

名二環や伊勢湾岸道、一般道などへ迂回された場合は通行料金を「調整」します




工事期間中は、工事規制区間及び名古屋西JCT付近を先頭に発生するC2名二環（内回り）の渋滞を避けるため、他の高速道路や一般道へ迂回いただいた場合は、工事規制区間を迂回せずに利用された場合の通行料金と同額となるように通行料金を調整いたします。（迂回せずに直通利用されるより料金が高くなる場合のみ）

- ◇対象車種
- : 全車種 (ETC車限定)
- ◇対象期間
- : 2025年1月27日(月)0時～2027年春頃まで ※記載の対象期間にかかわらず、工事規制が終わり次第、料金調整を終了します

高速道路迂回

下表の出発エリアから到着エリアまでの間を、経由地点のいずれかを經由して伊勢湾岸道へ迂回いただいた場合に通行料金を調整いたします。


出発エリア	C2 名二環	すべてのIC（東名から乗り継ぐ場合を除く）
	名古屋高速	すべての入口（名神から乗り継ぐ場合を除く）
経由地点	E1A 伊勢湾岸道	飛島JCT、東海JCT、名古屋南JCTのいずれか
到着エリア	E23 東名阪道	桑名東IC以西
	E23 伊勢道	すべてのIC
	E42 紀勢道	すべてのIC
	E1A 新名神	菰野IC、鈴鹿PAスマートIC
	C3 東海環状道	大安IC、東員IC

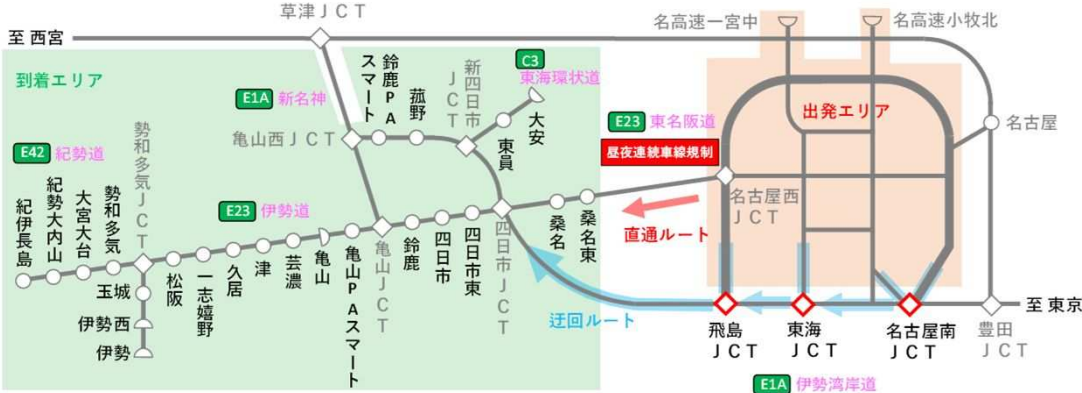

一般道迂回

下表の流出ICで一旦流出し、再流入ICから同一方向に乗り継ぐ場合に通行料金を調整いたします。

流出IC	再流入IC
C2名二環 甚目寺南IC 大治南IC	C2名二環 千音寺南IC 富田IC 南陽IC

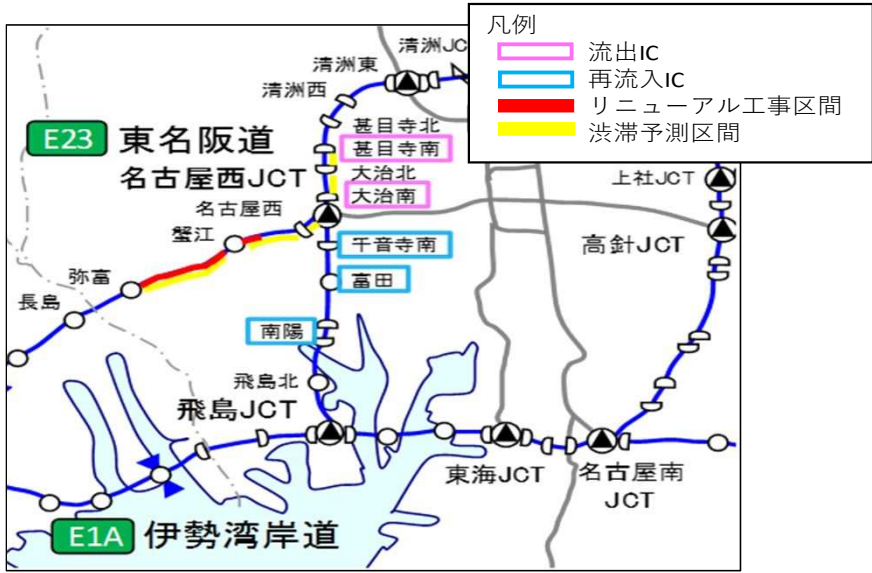

※料金調整の詳細は、東名阪道リニューアル工事専用Webサイトをご確認ください。
